



**BIOMETRIA**



# Guide för verksamhetsplaneringen inför omläggning



## Guide – Verksamhetsplanering | 1 av 9

- » Från och med Go Live 2025-05-02 för VIOL 3 innebär det att **så snart som möjligt förflytta** din verksamhet från VIOL 2 till VIOL 3
  
- » Verksamhetsplanen måste ta hänsyn till att omlägningsperioden från Go Live till 2025-10-31
  
- » VIOL 2 stängs för inkörning/ankomstregistrering 2025-10-17, för att mätningorganisationen ska få möjlighet att mäta in all råvara kopplad till VIOL 2
  
- » VIOL 2 stängs för inmätning 2025-10-31, det gäller alla system Biometria tillhandahåller för inmätning
  
- » Omlägningsplanen omfattar hur du vill hantera:
  1. Interna affärer eller affärer med få affärsled vid Go Live
  2. Affärer med flera affärspartners i kontraktskedjan kan startas upp successivt när alla i kedjan är klara med sina respektive kontrakt
  3. Affärer som inte hinner avslutas under omlägningsperioden i VIOL 2
  4. Affärer med bränslesortiment kan behöva läggas upp på nytt i VIOL 3




## Guide - Engagera verksamheten | 2 av 9

- » Viktiga roller i verksamheten som behöver engageras:
  - » Virkesadministratörer
  - » Avtalsansvariga både på central och lokal nivå (köp/sälj)
  - » Produktionsledare
  - » Transportledare
- » Pågående avtal som levereras efter 2025-10-17 behöver läggas upp på nytt i VIOL 3
- » Avsluta era affärer i VIOL 2 efter 2025-10-17 innebär att:
  - » Justeringar på råvarupriser kan komma efter att VIOL 2 stängts för inmätning
  - » Eventuella avvisade mätningar kommer behöva hanteras i VIOL 2 fram till 2026-01-31
  - » Mätbesked kommer skickas ut när allt har korrigerats och prisräknats en sista gång fram till 2026-01-31
- » Omlägningsperioden innebär att överenskomna försörjningsåtaganden behöver finnas i både VIOL 2 och VIOL 3




# Guide - Inmätning och redovisning under Omläggningen | 3 av 9

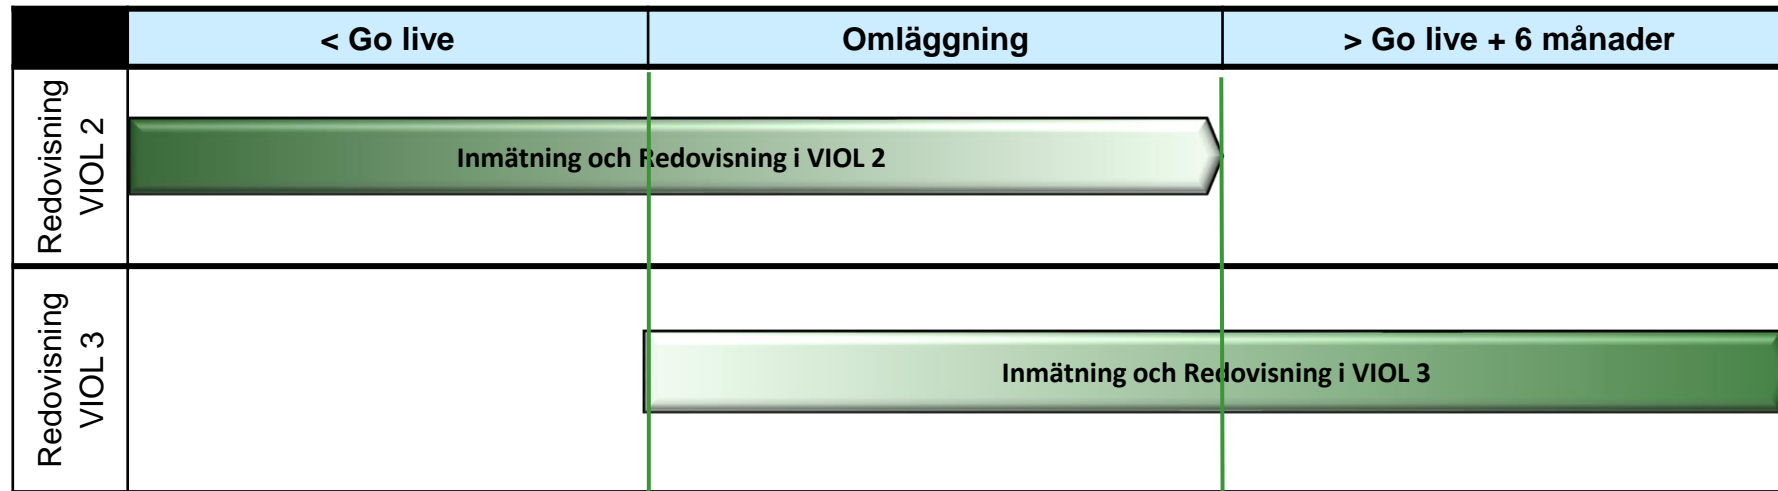

- » Vid leverans av råvara kan mätresultatet komma att påverkas olika beroende på vilket system det mäts in i.
  - » Mätningar från VIOL 2 kommer att hanteras med Förstaledskontrakt, Virkesorder och övriga affärsobjekt i VIOL 2 och för aktuell tid gällande prisuppgörelser.
  - » Mätningar från VIOL 3 den nya strukturen med Avtalsobjekt och dess tillhörande kontraktsdelar och nya prisobjekt för samma leveranstidpunkt som i VIOL 2
- » Mindre avvikelser kan eventuellt förekomma vid leveranser inom affärsflöden som innefattar samma parter som redovisas i både VIOL 2 och VIOL 3.

# Guide - Inmätning och redovisning under Omläggningen | 4 av 9

## Förhållandet till Kollektiv

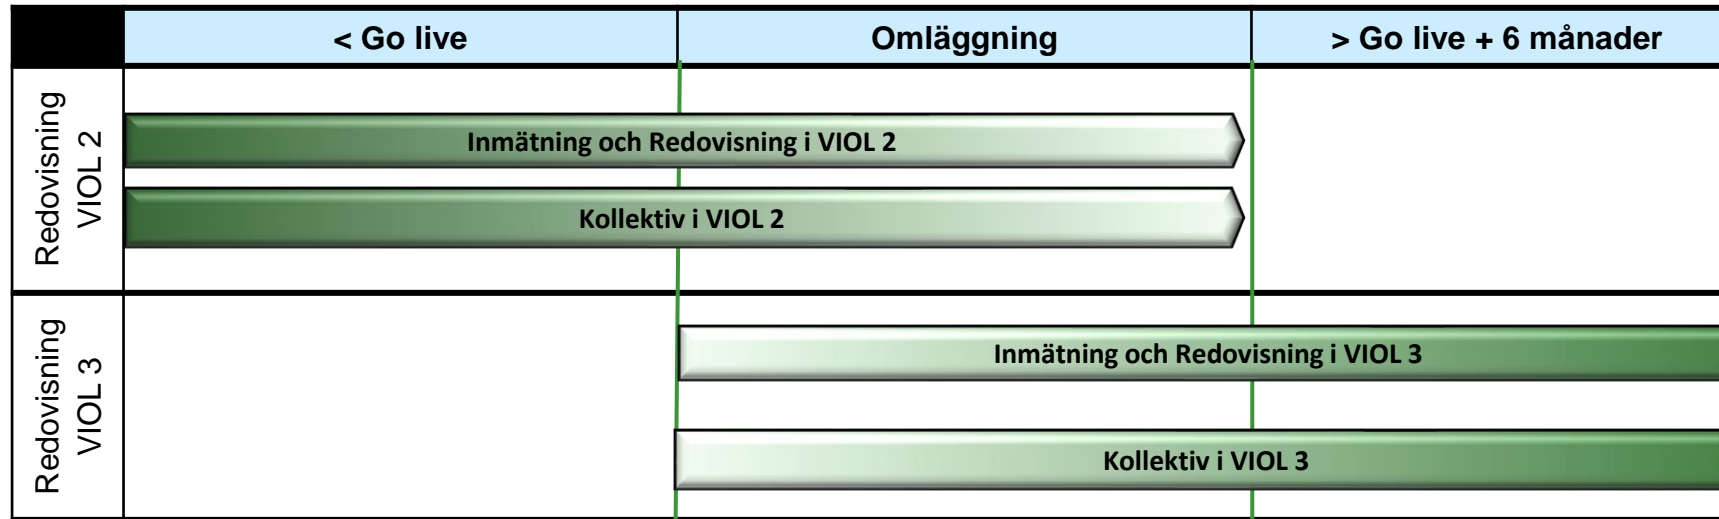

- » Vid inmätning av råvara som omfattas av Kollektiv kommer mätresultatet att påverkas olika beroende på vilket system det mäts in i.
  - » Mätningar från VIOL 2 kommer att påverkas av stickprover från en längre tid tillbaka och skapa omräkningstal för kvantitet och eventuellt värde.
  - » Mätningar från VIOL 3 kommer att påverkas av bedömda basomräkningstal och från succesivt utfallna stickprover som skapar nya omräkningstal för kvantitet och eventuellt värde.
- » Kollektivens kvantitet och eventuellt värde kommer därvid att vara olika vid leveranser som innefattar samma affärsflöde men i olika system.

# Guide - Interna affärer eller affärer med få affärsled vid Go Live | 5 av 9



Från

Till

Sågverk



Sågverk



Massabruk



Terminal



Terminal



Import eller Inhemska  
leveranser på fartyg/tåg



Värmeverk



- Terminal till egen industri
- Sågverksflis till massabruk
- Egen import på båt och tåg
- Affärer med få affärsled



Från

Sågverk



Terminal



Avverkningsplats



Till

Sågverk



Massabruk



Terminal



Värmeverk



- Planera med affärspartners i dina kontraktskedjor
- Alla ingående parter måste ha sin organisationsstruktur upplagd i VIOL 3
- Platsstrukturen för mottagande industri måste var upplagd i VIOL 3
- Ta hänsyn till att planerade avverkningar i VIOL 2 klarar omlägningsperioden på ca 6 månader





## Guide - planera drivning | 7 av 9

- » Produktionsrapportering i VIOL 3 är möjligt från 2025-05-02 (Go live)
- » Sista dag för inkörning/ankomstregistrering av råvara är 2025-10-17 och därför bör ersättningsgrundande skördarmätning, avverkning och produktionsrapportering av trakter i VIOL 2 vara klara i god tid innan dess
- » Trakter i VIOL 2 som hinner bli klara före eller närtid efter Go Live kan startas i VIOL 2
- » Trakter i VIOL 2 som **inte** hinner blir klara under omlägningsperioden – ta ställning till om du kan avvakta till Go Live för VIOL 3 eller dela upp trakten i mindre avdelningar (lägg upp trakten i både VIOL 2 och VIOL 3)



## Guide - planera skogsbränsle | 8 av 9

- » Sista dag för inkörning/ankomstregistrering av råvara är 2025-10-17
- » Skogsbränslen har längre ledtid än övriga sortiment (ligger och torkar i skogen)
- » Om intransporten av bränsledelen från trakten kommer ske efter 2025-10-17 behöver denna del av affären läggas upp i VIOL 3
- » Rundvirkesdelen redovisas därmed i VIOL 2 och skogsbränsledelen i VIOL 3



## Guide - planera logistik | 9 av 9

- » Kör klart VIOL 2 affärer **så tidigt som möjligt** under omlägningsperioden
- » Sista dag för inkörning/ankomstregistrering av råvara i VIOL 2 är 2025-10-17
- » Säkerställ att dina affärspartners för transport och deras chaufförer är redo för VIOL 3
- » I leveransprocessen ska det vara **tydligt för chauffören** om det är VIOL 2 eller VIOL 3 råvara som ska lastas, transporteras och levereras
- » Samlastredovisning mellan VIOL 2 och VIOL 3 är **inte möjligt**
- » Principer för samtransporter av VIOL 2 råvara och VIOL 3 råvara kommer under april 2024
